



TECOZAUTLA
— AYUNTAMIENTO 2016 - 2020 —
MUNICIPIO EN ACCIÓN

MUNICIPIO DE TECOZAUTLA.

**PROGRAMA DE OBRAS
AUTORIZADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES.**

**SEGUNDO TRIMESTRE
2018.**



MUNICIPIO DE: TECOZAUTLA, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2012

MR-01

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUHTLA
 Área: OBRAS PÚBLICAS
 Responsable: ING. FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ HINOJOSA

[illegible]

DE \$198,325.64



ELABORÓ


DELIA ORTIZ TREJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS

TECOZAUTLA, HGO.



AUTORIZO




MR-01

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
 Área: OBRAS PÚBLICAS

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra reconocida	Participación de fondos federales		
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Físico	Financiero					
2013/FAISMO98106	CONEXION A DRENAJE SANITARIO	PAÑUE	\$	-	\$	275,840.19	\$	-	\$	275,840.19	\$	-	\$	275,840.19	100%	100%	DIRECTA	NO	

ELABORÓ
DELA ORTIZ TREJO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS
TECOZAUTLA, HGO.

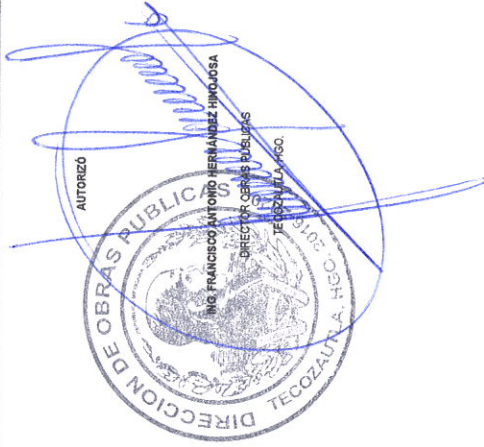



MR-01


Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
 Área: OBRAS PÚBLICAS
 Responsable: ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

[illegible]

ELABORÓ

DELIA ORTIZ TREJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS





Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA

Area: OBRAS PÚBLICAS

ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

ELABORÓ
DELIA ORTIZ TREJO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS
TECZAUTLA, HGO.




ELABORÓ

DELIA ORTIZ TREJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS

TECOZAUTLA, HGO.





Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
 Área: OBRAS PÚBLICAS
 Responsable: ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

ELABORÓ

DELIA ORTIZ TREJO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS

TECOZAUTLA, HGO.

AUTORIZÓ

ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

TECOZAUTLA, HGO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECOZAUTLA, HGO. 2016-2020

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TECOZAUTLA, HGO. 2016-2020



Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
 Área: OBRAS PÚBLICAS
 Responsable: ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

ELABORÓ
DELIA GUTIERREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS
TECOZAUHTLA, HGO.

PRESIDENTE MUNICIPAL
TECOZAUHTLA, HGO. 2016-2020


AUTORIZO
ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS
TECOZAUHTLA, HGO.

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE TECOZAUTLA
Área: OBRAS PÚBLICAS
Responsable: ING. FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ HINOJOSA

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
2017/FAISM059001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO	LA MESILLA	\$ -	\$ -	\$335,909.65	\$0.00	\$335,909.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$335,909.65	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO	BOÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	
2017/FAISM059003	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO	LA PAULA	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059004	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	EL MERCADER	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059005	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	
2017/FAISM059006	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO (BO. BOHAY)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI	
2017/FAISM059007	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CUANRHI	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059008	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ATENGO	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059009	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SEXTA MANZANA BARRIO HIDALGO SUR PONIENTE	TECOZAUTLA (SEXTA MANZANA)	\$ -	\$ -	\$66,433.90	\$0.00	\$66,433.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$66,433.90	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059010	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	GANDHO	\$ -	\$ -	\$202,500.00	\$0.00	\$202,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$202,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059011	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	BOMANKOTHA	\$ -	\$ -	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$150,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059012	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	YETHAY	\$ -	\$ -	\$311,315.89	\$0.00	\$311,315.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$311,315.89	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059013	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	YETHO CHICO	\$ -	\$ -	\$301,315.90	\$0.00	\$301,315.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$301,315.90	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059014	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	TZIDEHE	\$ -	\$ -	\$274,249.20	\$0.00	\$274,249.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$274,249.20	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059015	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	ALIBES	\$ -	\$ -	\$313,844.69	\$0.00	\$313,844.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$313,844.69	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059016	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOS CARRIZOS	TECOZAUTLA (BO. LOS CARRIZOS)	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059017	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BO. LOS PINOS)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$250,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059018	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BO. LA MEZA)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	
2017/FAISM059019	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BO. LOS MARTÍNEZ)	PAÑHE	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO	



2017/FAISM059020	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 13DPB0207R	RANCHO VIEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059021	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	NINTI	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISM059022	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL. OCAÑO	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$183,362.67	\$0.00	\$183,362.67	\$0.00	\$183,362.67	\$0.00	\$183,362.67	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059023	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LA SABINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS	MANGUANI	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS	EL PASO	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO	PAÑHE (BO. LA MAGUANI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISM059027	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO	PAÑHE (BO. LA NUEVA COLONIA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISM059028	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	TENZABHI	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059029	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. BOHAY)	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059030	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. LAS LONAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059031	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. CENTRO 1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059032	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BO. CERRITO BLANCO	SAN ANTONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059033	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	SAN FRANCISCO	\$ -	\$ -	\$ -	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059034	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	LA ESQUINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$367,500.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$367,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS	YERTHO CHICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$103,448.28	\$0.00	\$103,448.28	\$0.00	\$103,448.28	\$0.00	\$103,448.28	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISM059036	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	BOMANOTHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059037	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	EL OEDHO	\$ -	\$ -	\$ -	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059038	REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN	LA CRUZ DE PIEDRA (ATENGO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059039	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. CENTRO 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059040	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	PAÑHE (BO. LA COLONIA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISM059041	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO	RANZHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI



2017/FAISMO39064	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO	LA PRESA	\$ -	\$ -	\$ -	\$265,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39065	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	GANDHO	\$ -	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39066	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	SAN JOAQUIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	CONTRATO	100%	100%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	NO
2017/FAISMO39067	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	RANCHO VIEJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$137,931.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$137,931.09	\$0.00	\$137,931.09	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISMO39068	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$367,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$367,500.00	\$0.00	\$367,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39069	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	EL SALTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39070	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR "DISNEYLANDIA CLAVE: 13JUN0362"	GANDHO	\$ -	\$ -	\$ -	\$360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39071	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO EN CALLE LAS CAMPANAS	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39072	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS	TAMBATHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$103,448.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$103,448.28	\$0.00	\$103,448.28	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39073	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BO. LOS MOROS	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$168,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$168,660.00	\$0.00	\$168,660.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39074	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	LA SAUTREBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$262,500.00	\$0.00	\$262,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39075	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA LOS PINOS BO. EL CALVARIO	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39076	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	BOMANKOTHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	CONTRATO	100%	100%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	NO
2017/FAISMO39077	CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 13JUN0840	EL PASO	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISMO39078	AMPLIACIÓN DE EMPEDRAO EN BARRIO BONDIÑEZA	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39079	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO EN CALLE FRANCISCO MINA	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISMO39080	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO EN CALLE CHABACANO BO. MORELOS	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39081	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS	EL AVORCADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$103,448.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$103,448.28	\$0.00	\$103,448.28	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39082	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	SAN FRANCISCO	\$ -	\$ -	\$ -	\$367,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$367,500.00	\$0.00	\$367,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39083	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BO. LOS MOROS	TECOZAUULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39084	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	EL PALMAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$301,773.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$301,773.44	\$0.00	\$301,773.44	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39085	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	SAN MIGUEL CALTEPANTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO



2017/FAISMO39086	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PARED BLANCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39087	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTA MANZANA BO. MORELOS HACIA ENTRADA AL DOBANHÍ	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39088	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO LA OTRA BANDA BARRIO EL OASIS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39089	CONSTRUCCIÓN DE VADO CAMINO TECOZAUTLA - YETHAY	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39090	CONSTRUCCIÓN DE TECHO	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$40,670.72	\$0.00	\$40,670.72	\$ -	\$ -	\$40,670.72	\$0.00	\$ -	\$ -	\$40,670.72	\$0.00	\$40,670.72	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39091	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	BAHÍ	\$ -	\$ -	\$ -	\$292,320.17	\$0.00	\$292,320.17	\$ -	\$ -	\$292,320.17	\$0.00	\$ -	\$ -	\$292,320.17	\$0.00	\$292,320.17	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39092	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	LA LOMITA	\$ -	\$ -	\$ -	\$273,387.32	\$0.00	\$273,387.32	\$ -	\$ -	\$273,387.32	\$0.00	\$ -	\$ -	\$273,387.32	\$0.00	\$273,387.32	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39093	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LOS VILLEDA	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$159,259.97	\$0.00	\$159,259.97	\$ -	\$ -	\$159,259.97	\$0.00	\$ -	\$ -	\$159,259.97	\$0.00	\$159,259.97	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39094	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BO. EL CABACOL	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39095	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	LA JOYA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39096	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$172,413.80	\$0.00	\$172,413.80	\$ -	\$ -	\$172,413.80	\$0.00	\$ -	\$ -	\$172,413.80	\$0.00	\$172,413.80	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39097	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$ -	\$ -	\$720,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	CONTRATO	100%	100%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	NO
2017/FAISMO39098	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	BANZHA	\$ -	\$ -	\$ -	\$227,985.70	\$0.00	\$227,985.70	\$ -	\$ -	\$227,985.70	\$0.00	\$ -	\$ -	\$227,985.70	\$0.00	\$227,985.70	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39099	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	BOTHE	\$ -	\$ -	\$ -	\$312,203.48	\$0.00	\$312,203.48	\$ -	\$ -	\$312,203.48	\$0.00	\$ -	\$ -	\$312,203.48	\$0.00	\$312,203.48	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39100	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (BO. LOS GRANIZO)	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$462,500.00	\$0.00	\$462,500.00	\$ -	\$ -	\$462,500.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$462,500.00	\$0.00	\$462,500.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39101	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (BO. SANITAGUITO)	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39102	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BO. LOS CARRITOS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39103	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	BOXHÍ	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39104	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BO. LOS ARCOS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39105	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. LA METRALLA	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SI
2017/FAISMO39106	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$195,765.01	\$0.00	\$195,765.01	\$ -	\$ -	\$195,765.01	\$0.00	\$ -	\$ -	\$195,765.01	\$0.00	\$195,765.01	CONTRATO	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NO
2017/FAISMO39107	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y ACCESORIOS	TECOZAUTLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$143,634.00	\$0.00	\$143,634.00	\$ -	\$ -	\$143,634.00	\$0.00	\$ -	\$ -	\$143,634.00	\$0.00	\$143,634.00	CONTRATO	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	NO

